


Informace ke stavbě silnice v obci !!

Dne 3.8.2021 bylo dohodnuto, že stavba silnice v obci začne dne 10. 8. 2021 s tím, že propustek u p. Koháčka (č. p. 25 Vernířovice, km 2, 167), bude uzavřen ve dnech 30. – 31. 8.2021 od 7:00-16:00hod. Ostatní propustky se dají objet buď po místní komunikaci nebo po štěrkovém provizoriu. Pouze pro osobní auta dopravní obsluhy (včetně provozu ubytovacích objektů), Propustky mezi obecním úřadem a Sedmidvory budou uzavřeny v termínu od 30. 8. 2021. V případě uzavření těchto dvou propustků bude stavba průjezdná v době od 16:00 do 7:00 hodin v pracovní dny, o víkendů bez omezení, vyjma závěrečné etapy (v září) na úpravu povrchu, která bude stavbou upřesněna.

Bohumila Hojgrová, starostka obce

Úplná uzavírka sil. III/4501 v obci Vernířovice - postup prací

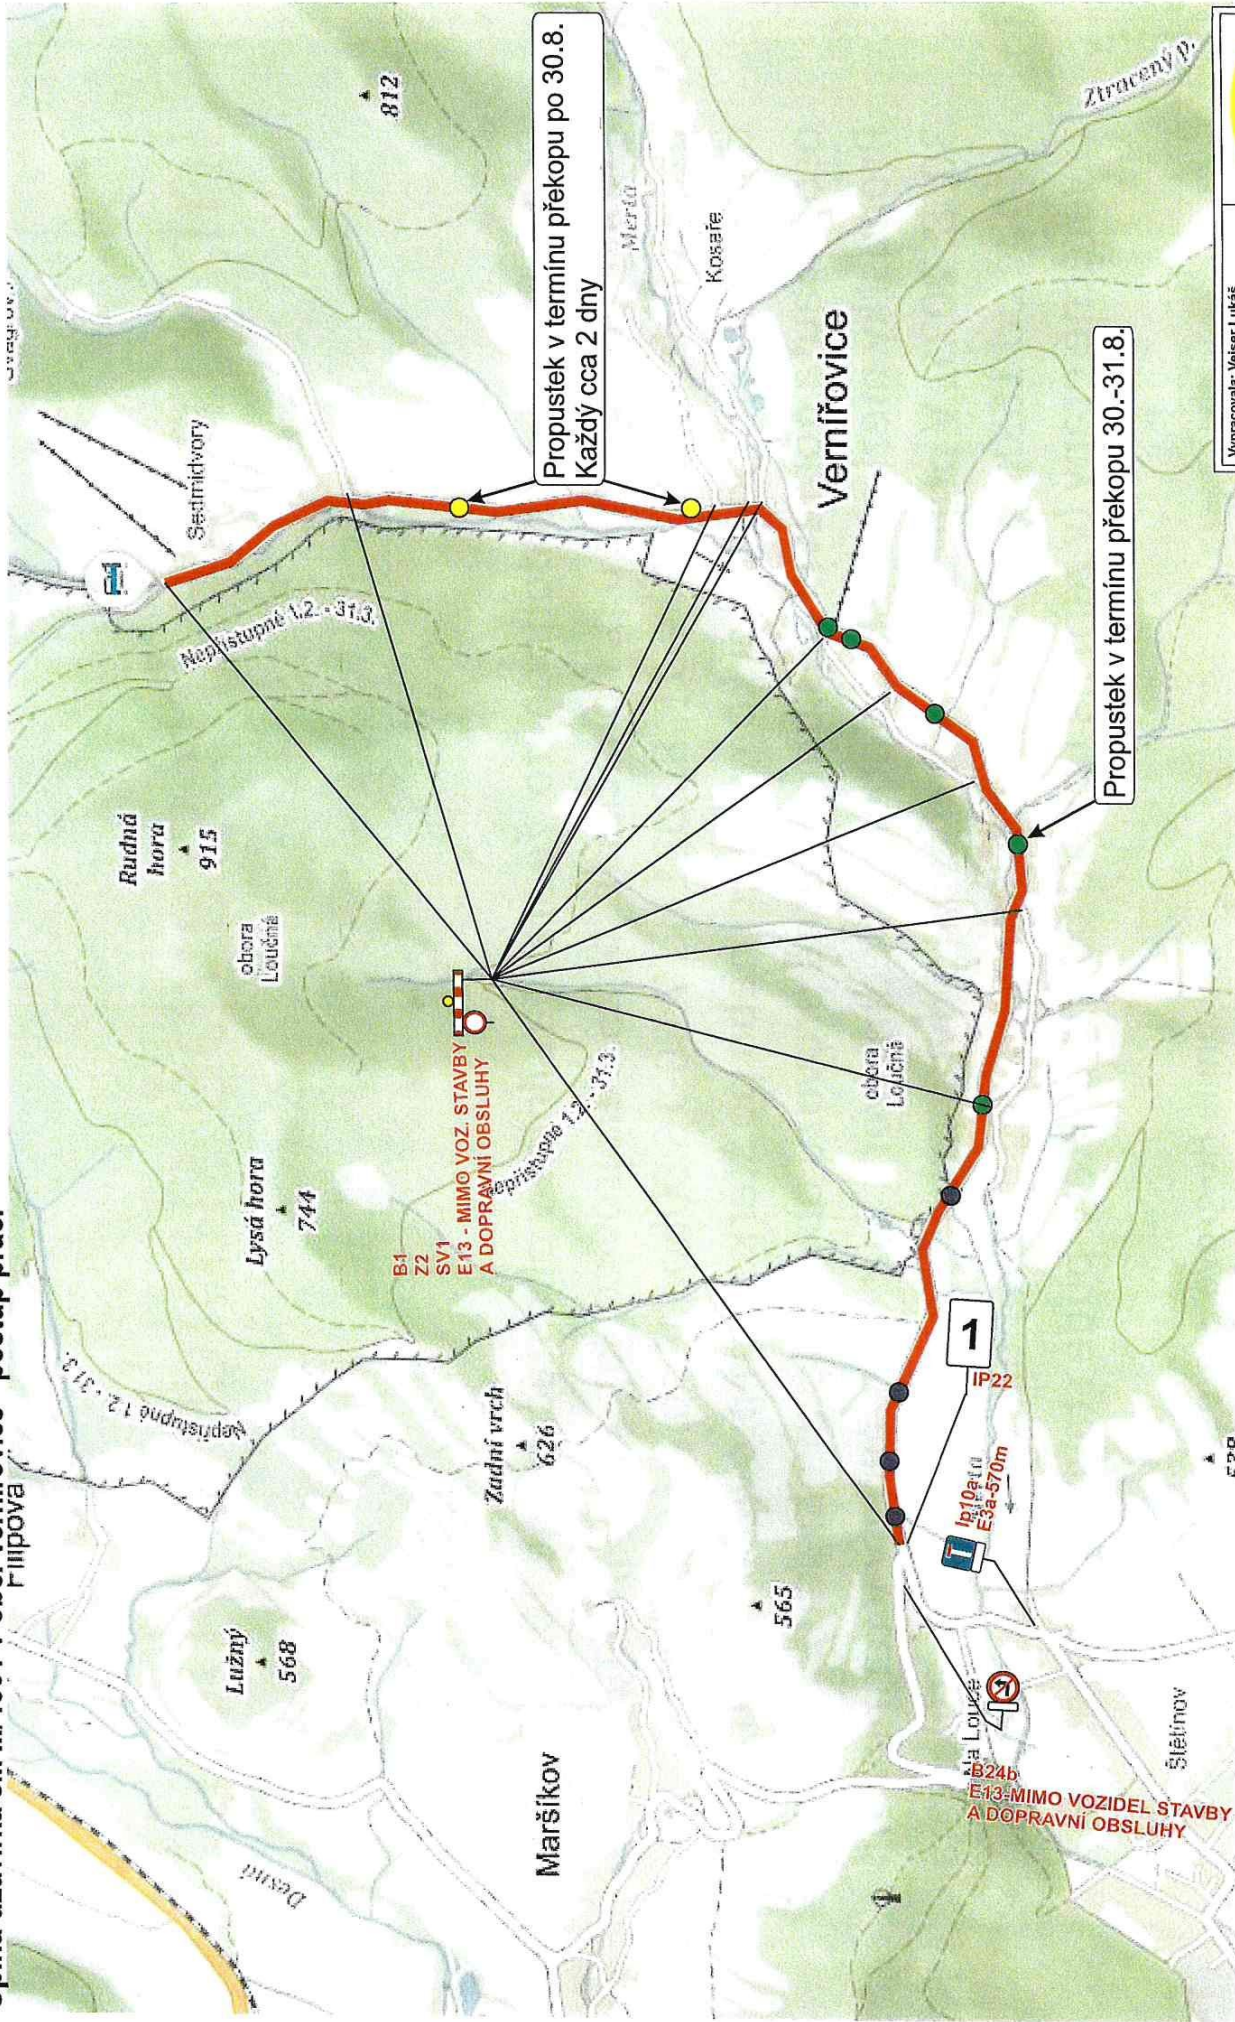

- Úsek stavebních prací - povrchy cca 6.9.-19.9.2021 + dokončovací práce 20.9.-28.9.2021
- Propustek s vybudovanou provizorní komunikací - cca 10.8.-31.8.2021
- Propustek za úplné uzavírky od 7:00-16:00 - cca 10.8.-17.8.2021
- Propustek za úplné uzavírky od 7:00-16:00 - cca 30.8.-7.9.2021

Propustek v termínu překopu po 30.8.
Každý cca 2 dny

Propustek v termínu překopu 30.-31.8.

SVĚBODA	
Výpracovala: Veiser Lukáš	
Datum: 7.7.2021	
Úplná uzavírka sil. III/4501 v obci Vernířovice	
Adresa provozovny: Pavlačkova 2 Olomouc 772 00	
